

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : TREBIŠOV

**NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2021**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – detašované pracovisko Trebišov

Meno : Ing. Milan Kurtoš

Kontakt : tel. 056/6688440

E – mail: milan.kurtos@ssc.sk

PRACOVISKO: TREBIŠOV

Nehodové lokality v roku 2021


podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/19** v km 34,920 – 35,870 intravilán mesta Sečovce

Nehodová lokalita na ceste I/19 v km 34,920 – 35,870

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov

Situačná mapa

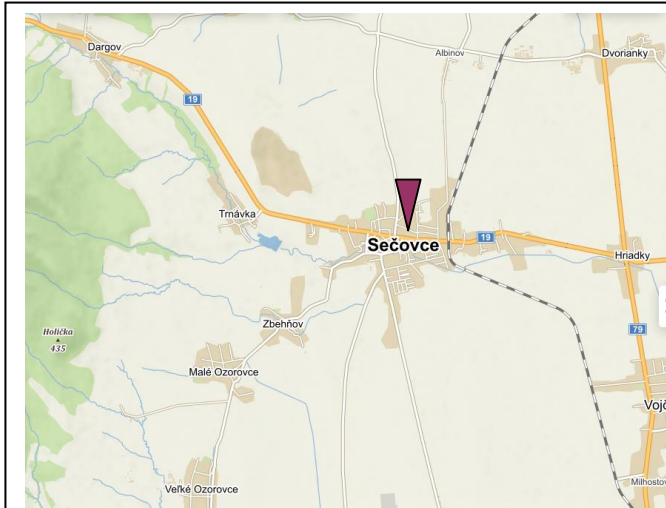

▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

V rámci údržby:

- obnova VDZ
- bežná údržba povrchu vozovky

Vynaložené finančné náklady : -

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/19 v intraviláne mesta Sečovce. Úsek začína na ul. Obchodnej 30m pred križovatkou s ul. Štúrová a končí za žel. priecestím v ľavotočivej zákrute pred domom č.p:1602/150 na ul. Kochanovskej. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 6559 vozidiel/24 hod.. z toho 21.6 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2021 spolu 5 DN, pri ktorých bolo 5 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 53,42 tis. €.

Príčiny DN: Nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávny spôsob jazdy, porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami a chodci.

Navrhované opatrenia:

V rokoch 2022-24 sa na danom úseku navrhuje oprava živичného krytu vozovky cesty, čím by sa značne vylepšil stavebno-technický stav povrchu vozovky vrátane cestného príslušenstva.

Termín realizácie: 2023 – 2024

Predpokladané investičné náklady : 540 tis.€

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia

