

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC
Banská Bystrica**

Pracovisko: Lučenec

**SPRÁVA O OPATRENIACH NA
NEHODOVÝCH LOKALITÁCH
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2025**


PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá:	Slovenská Správa ciest investičná výstavba Banská Bystrica
Meno:	Mgr. Igor Čierny
Tel. kontakt:	0903 406 116
Email:	igor.cierny@ssc.sk
Podpis:	

Nehodová lokalita na ceste I/75 v km 193,100 - 194,07, intravilán mesta Lučenec

Investor:

Situačná mapa

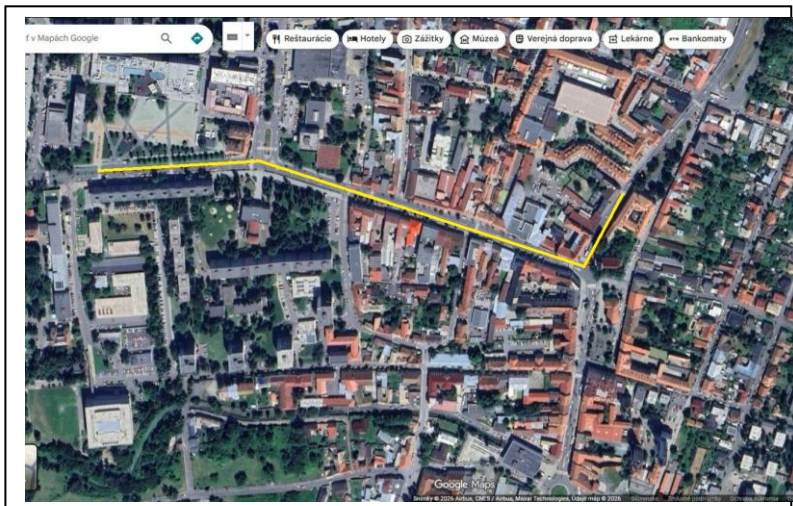

Miestopis a okolie:

Priechody pre chodcov na ceste I/75 v intraviláne meste Lučenec na Ul. Námestie Republiky, Ul. T. G. Masaryka a Ul. J. Kármána.

Príčiny dopravných nehôd:

Nerešpektovanie DZ na ceste I/75 (nedanie prednosti chodcom na priechode pre chodcov,)

 - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia:

Obnova VDZ na ceste I/75, realizácia zviditeľnenia dvoch priechodov pre chodcov (jeden z nich pri škole už v roku 2025 nie zaradený v rámci NL) technológiou dvojzložkového červeného plastu s protišmykovou úpravou farbeným žulovým kamenivom.

Vynaložené investičné náklady: náklady hradené z bežných výdavkov na údržbu v objeme cca 27 000 €.

Navrhované opatrenia:

Zriadiť verejné osvetlenie s vyššou intenzitou alebo odlišnou farbou priamo nad priechodmi pre chodcov, ktoré je najúčinnnejším spôsobom ochrany chodcov za zníženej viditeľnosti, toto opatrenie je v kompetencii mesta Lučenec; prípadne zrekonštruovať priechody pre chodcov na inteligentné s ochrannými ostrovčekmi a výstražnou optickou signalizáciou pohybu chodca na priechode.

Začiatok úseku NL v smere staničenia


Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/75 v km 158,100 - 158,690, intravilán mesta Veľký Krtíš , križovatka ciest I/75 – II/527

Investor:

Situačná mapa

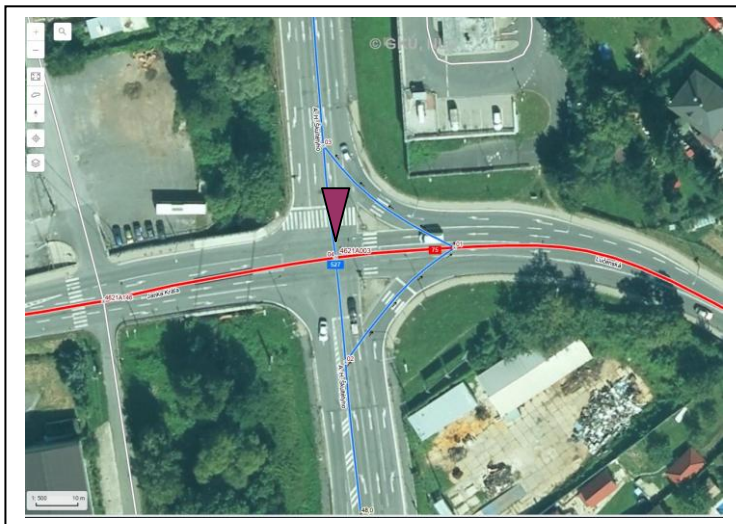

▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia: nadštandardné ZDZ a VDZ na vedľajšej ceste realizované jej správcom
Obnova VDZ na ceste I/75

Vynaložené investičné náklady: náklady hradené z bežných výdavkov na údržbu v objeme cca 3 000 €

Miestopis a okolie:

Križovatka ciest I/75- II/527 v intraviláne mesta Veľký Krtíš

Príčiny dopravných nehôd:

Nerešpektovanie DZ na ceste II/527 (nedanie prednosti v jazde vozidlám na hlavnej ceste I/75)

Navrhované opatrenia:

Prestavba križovatky z priesečnej na okružnú: vypracovaná PD, prebieha inžinierska činnosť
Stavba : Úprava križovatky ciest I/75 – II/527 na okružnú križovatku Veľký Krtíš

Termín realizácie: 2027 – 2028 závisí od termínu pridelenia finančných prostriedkov

Predpokladané investičné náklady:

826 200 € s DPH

Začiatok úseku NL v smere staničenia

Koniec úseku NL proti smeru staničenia

