

10a F, 0a  
2x HS HSV

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo na zhotovenie stavby č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa ZoD /0152/2004/HS-HSV), zo dňa 07.07.2004, "**Oprava a rekonštrukcia administratívnej budovy Investičnej výstavby a správy ciest Košice**", ktorú uzavreli zmluvné strany 0233/HS-HSV/04/P

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Práva forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 321/M-2003 zo dňa 05.02.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

a

**Zhotoviteľ** : HS HSV s.r.o., Hroncova 3, 040 33 Košice  
Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro, vložka číslo : 12159/V

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č.1, ktorým sa menia a dopĺňajú tieto ustanovenia ZoD 6310/01/04 (č. ZoD zhotoviteľa: ZoD/0152/2004/HS-HSV) zo dňa 7.7.2004 nasledovne :

### ZMLUVNÉ STRANY :

#### 1. Objednávateľ :

Bankové spojenie - VÚ ŠR SSC 7000/1354/8180, vedený v Štátnej pokladnici

### A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Z dôvodu navyše prác požadovaných objednávateľom, ktorých rozsah je odsúhlasený, na základe zápisov v stavebnom denníku a doplnenej projektovej dokumentácie, sa jednotlivé články zmluvy o dielo upravujú takto :

#### 2. Čas plnenia

<b>bod 2.2</b> - termín ukončenia stavby	31.05.2005
<b>bod 2.2.1</b> Časť A) - termín ukončenia vnútorných prác	31.12.2004
- termín ukončenia fasády	31.05.2005
Časť B) - termín ukončenia kotolne	31.01.2005

**3. - Cena diela****bod 3.1 - dopĺňa sa takto :**

V zmysle bodu 3.3 a čl. 45 Všeobecných zmluvných podmienok vzhľadom k naviac prácam sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

- cena podľa výkazu výmer	6.871.157,- Sk
- cena prác zmeny technického riešenia	3.079.573,- Sk
- <b>upravená cena bez DPH</b>	<b>9.950.730,- Sk</b>
- DPH 19 %	1.890.639,- Sk
- <b>upravená zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>11.841.369,- Sk</b>

**bod 3.1.1 - Časť A) - Oprava administratívnej budovy Košice - dopĺňa sa takto :**

- cena podľa výkazu výmer	5.060.977,- Sk
- cena prác zmeny technického riešenia	1.545.152,- Sk
- <b>upravená cena bez DPH</b>	<b>6.606.129,- Sk</b>
- DPH 19 %	1.255.165,- Sk
- <b>upravená zmluvná cena celkom s DPH časť A) :</b>	<b>7.861.294,- Sk</b>

**bod 3.1.2 - Časť B) - Košice administratívna budova rekonštrukcia**


- cena podľa výkazu výmer	1.810.180,- Sk
- cena prác zmeny technického riešenia	1.534.421,- Sk
- <b>upravená cena bez DPH</b>	<b>3.344.601,- Sk</b>
- DPH 19 %	635.474,- Sk
- <b>upravená zmluvná cena celkom s DPH časť B)</b>	<b>3.980.075,- Sk</b>

Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení zmluvy o dielo č. **6310/01/04**, č. **zmluvy podľa zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV** platí Dodatok č. 1. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

**Košice, dňa: 26.11.2004.**

Objednávateľ :

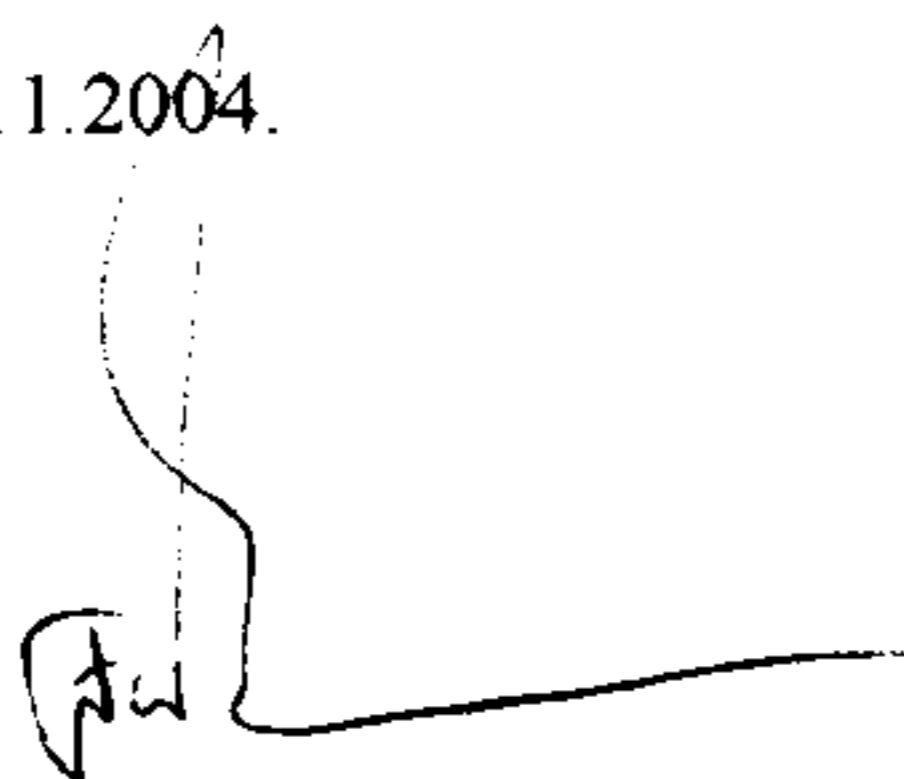

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**Košice, dňa : 26.11.2004.**

Zhotoviteľ :



Ing. Daniel Olejňák  
konateľ a generálny riaditeľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

-5-

Ing. Michal Horňák  
konateľ a technický riaditeľ

